



DECISÃO FINAL DA COMISSÃO SOBRE O CONTRATO 046/2023

Eu, **Raudiego da Silva Santos Figuerêdo**, Engenheiro Civil, CREA nº 121118777-2, servidor contratado da Prefeitura Municipal de Vila Rica – MT, designado como Engenheiro Fiscal da obra de reforma e ampliação da Escola Estadual Militar Tiradentes SD PM Antônio Eustáquio de Paula, SCERETARIO nomeada pela **Portaria nº 171/2025** para composição da COMISSÃO ESPECIAL instituída, venho, com respaldo técnico e em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/1999), apresentar **DECISÃO FINAL DA COMISSÃO** em referência ao Parecer Jurídico emitido em 07 de maio de 2025 pelo Assessor Jurídico Municipal, Sr. Jefferson Rodrigo dos Santos Trindade.

A referida obra, objeto do Contrato de Empreitada Global nº 046/2023, firmado com a empresa KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP, CNPJ nº 13.735.497/0001-38, teve seu início em 11 de outubro de 2023, com prazo de vigência contratual de 360 dias corridos, contados a partir da data da assinatura.

Após reiteradas constatações de descumprimento de cláusulas contratuais, especialmente da **Cláusula 7.4**, esta Administração optou, conforme orientação jurídica, pela **rescisão unilateral do contrato**, com fundamento no **art. 155, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, combinado com as sanções administrativas previstas nos incisos **II e III do art. 156** do mesmo diploma legal.

Contudo, por decisão fundamentada da Administração Municipal, **não serão aplicadas penalidades de natureza pecuniária à contratada**, restringindo-se as sanções às medidas administrativas cabíveis. Assim, serão aplicadas apenas as **sanções de natureza administrativa**, conforme os dispositivos legais acima mencionados, preservando-se, todavia, o equilíbrio contratual quanto aos serviços efetivamente executados até a data da paralisação da obra.

Neste contexto, considerando que:

- a execução parcial da obra gerou avanço físico mensurável e documentado pela fiscalização;
- a paralisação definitiva da obra foi precedida de instrução processual regular, incluindo o contraditório e a ampla defesa à empresa;
- a ausência de multa torna desnecessária a retenção de valores ou compensações financeiras punitivas;



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA PORTAL NORTE DE MATO GROSSO

Recomenda-se à contratada a imediata emissão da Nota Fiscal correspondente aos serviços efetivamente prestados (Boletim de Medição realizado pelo fiscal da Obra) até a data da paralisação, para fins de **medição final e realinhamento físico-financeiro**, permitindo o cumprimento da obrigação pela Administração Pública, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021, que trata da verificação da efetiva prestação do serviço como condição para pagamento.

Ressalto que a autorização para pagamento da medição final encontra respaldo no dever da Administração de honrar compromissos contratuais relativos a entregas verificadas, em observância aos princípios da **boa-fé** e da **legalidade estrita na execução orçamentária e financeira do contrato público**.

Sem mais, e resguardados todos os trâmites legais pertinentes, **prosseguiremos para as tratativas finais de rescisão formal do contrato**, com as devidas assinaturas e registros administrativos, nos moldes do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

É O PARECER DA COMISSÃO.

Vila Rica – MT, 20 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOELITON SANTOS MACHADO
Data: 22/05/2025 13:30:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joeliton dos Santos Machado
Secretário de Educação Municipal
Portaria 008/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RAUDIEGO DA SILVA SANTOS FIGUEREDO
Data: 21/05/2025 15:46:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
Eng. Civil CREA 121118777-2
Departamento de Engenharia e Fiscalização

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA ESTER INACIO DE MELO
Data: 21/05/2025 16:22:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Ester Inacio de Melo
Diretora de Departamento de Ensino
Portaria 048/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
Departamento de Engenharia / Secretaria Municipal de Educação

CONTRATO Nº 046/2023

PROCESSO LICITARIO Nº 008/2023

CONVENIO SEDUC Nº 0356/2022

INICIO DA OBRA: 11 de outubro de 2023

VIGÊNCIA: 360 DIAS

ENDEREÇO: RUA 52, nº 723 / SETOR OESTE VILA RICA - MT

OBJETO DO CONTRATO:	Reforma e Ampliação da Escola Estadual Militar Tiradentes SD PM Antônio Eustáquio de Paula.
EMPRESA CONTRATADA:	KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
CNPJ DA CONTRATADA:	13.735.497/0001-38
DATA DA VISITA TÉCNICA:	09/01/2025
ENGENHEIRO FISCAL:	Eng. Civil Raudiego da Silva Santos Figuerêdo CREA: 121118777-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

 <p>9 de janeiro de 2025 às 11:18 22L 485728.8892491 347° N Rua Cinquenta e Um, 139 Vila Rica MT 78645-000 Brasil E.E. MILITAR</p>	 <p>9 de janeiro de 2025 às 11:19 22L 485728.8892491 192° S Rua Cinquenta e Um, 139 Vila Rica MT 78645-000 Brasil E.E. MILITAR</p>
DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA Conteúdo: Almoxarifado 3 Data: 09/01/2025	DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA Conteúdo: Almoxarifado 3 Data: 09/01/2025



GOVERNO MUNICIPAL DE
VILA RICA
PORTAL NORTE DE MATO GROSSO



DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Banheiro (Sala dos Professores)

Data: 09/01/2025



DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Varanda Coberta (Sala dos Professores)

Data: 09/01/2025



DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Varanda Coberta (Coordenação/Direção)

Data: 09/01/2025



DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Banheiro (Sala dos Professores)

Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 11:17
22L 485728 8892491
316° NW
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR



9 de janeiro de 2025 às 11:18
22L 485692 8892505
108° S
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Banheiro (Sala dos Professores)

Data: 09/01/2025


DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Varanda Coberta (Salas de Aprendizagem)

Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 11:12
22L 485699 8892512
126° SE
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

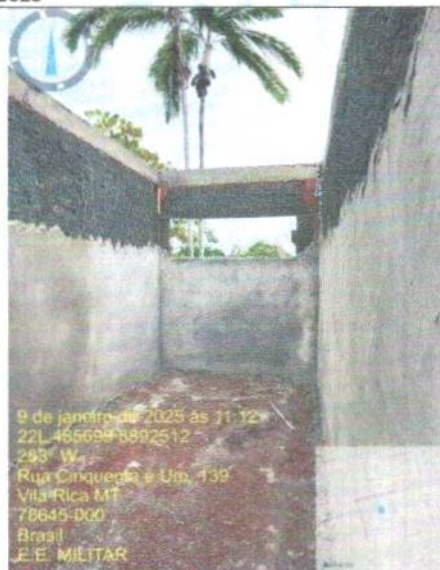

9 de janeiro de 2025 às 11:12
22L 485699 8892512
293° W
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Almojarifado 1

Data: 09/01/2025

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Almojarifado 1

Data: 09/01/2025



GOVERNO MUNICIPAL DE
VILA RICA
PORTAL NORTE DE MATO GROSSO



9 de janeiro de 2025 às 11:12
22L 485689 8892511
165° S
Rua Querenta e Otto
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Varanda Coberta
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 11:12
22L 485689 8892511
164° S
Rua Querenta e Otto
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Almojarifado 1/Sala C.A
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 11:11
22L 485684 8892501
91° E
Rua Querenta e Otto
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA


Conteúdo: Parte Externa Bloco Escolar (Ampliação)
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 11:11
22L 485706 8892495
119° SE
Rua Cinquent e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA


Conteúdo: Sistema Sanitário (Fossas/Filtros/Sumidouros)
Data: 09/01/2025

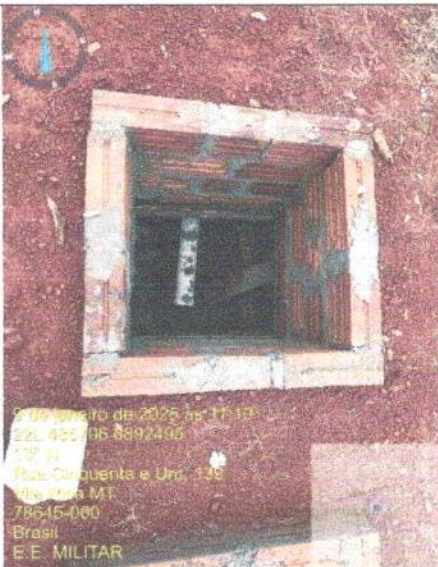

9 de janeiro de 2025 às 11:10
22L 485761 8892495
507 E
Rua Cinquenta e Um, 129
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA


Conteúdo: Sistema Sanitário (Fossas/Filtros/Sumidouros)
Data: 09/01/2025

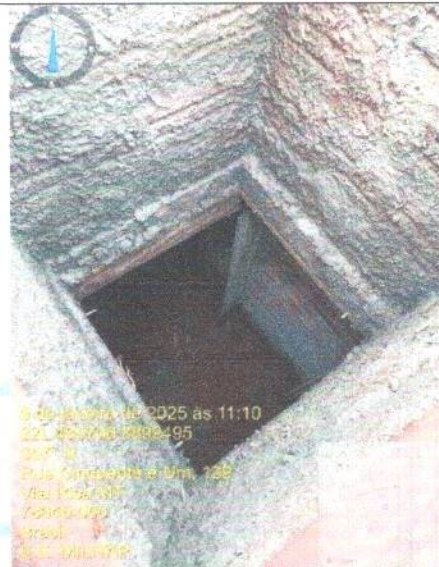

9 de janeiro de 2025 às 11:10
22L 485761 8892495
507 E
Rua Cinquenta e Um, 129
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Sistema Sanitário (Fossas/Filtros/Sumidouros)
Data: 09/01/2025

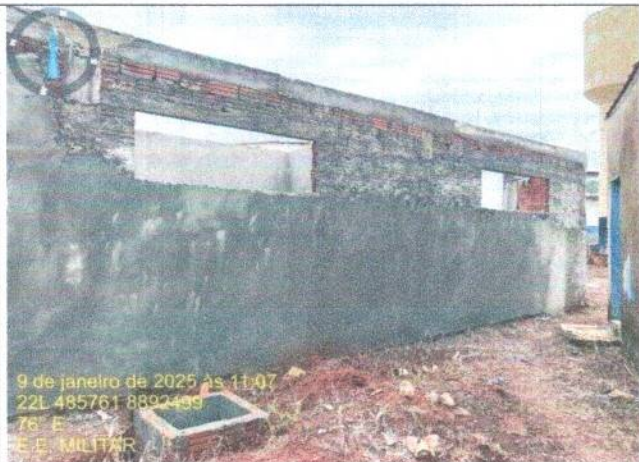

9 de janeiro de 2025 às 11:07
22L 485761 8892495
76 E
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA


Conteúdo: Parte Externa Bloco Escolar (Ampliação)
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 11:07
22L 485761 8892495
507 E
Rua Cinquenta e Um, 129
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão
Data: 09/01/2025

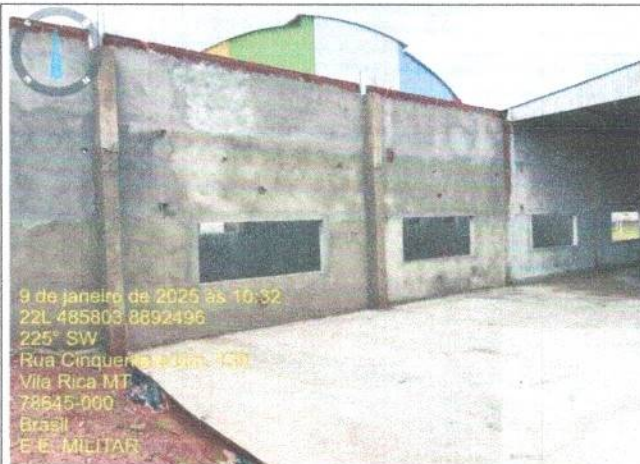

9 de janeiro de 2025 às 10:32
221.485803.8892496
225° SW
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR




9 de janeiro de 2025 às 10:31
221.485803.8892496
275° W
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão
Data: 09/01/2025

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão
Data: 09/01/2025

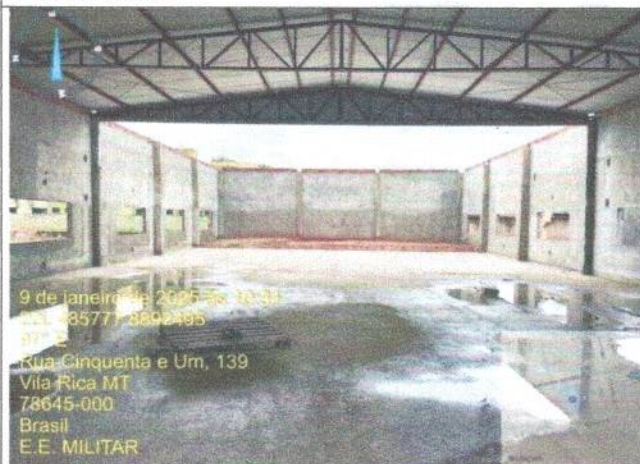

9 de janeiro de 2025 às 10:31
221.485777.8892495
91° E
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR



9 de janeiro de 2025 às 10:31
221.485777.8892495
100° E
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão
Data: 09/01/2025

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão
Data: 09/01/2025




GOVERNO MUNICIPAL DE
VILA RICA
PORTAL NORTE DE MATO GROSSO



9 de janeiro de 2025 às 10:30
22L 486773 8892486
93° E
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão (Fachada)
Data: 09/01/2025

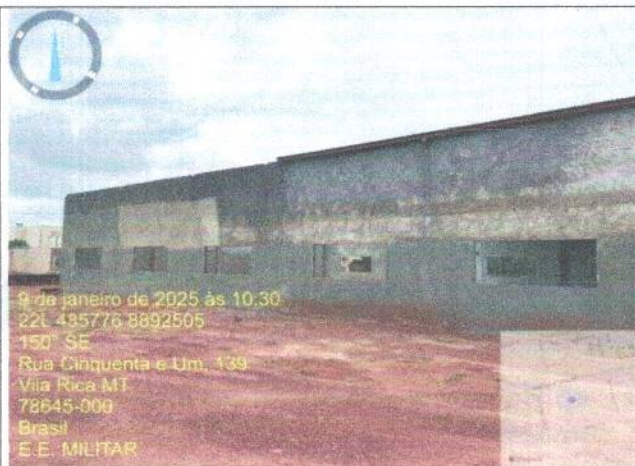

9 de janeiro de 2025 às 10:30
22L 485776 8892505
150° SE
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA


Conteúdo: Ampliação do Barracão (Parte Externa)
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 10:25
22L 486813 8892486
276° W
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão e Vestiários
Data: 09/01/2025

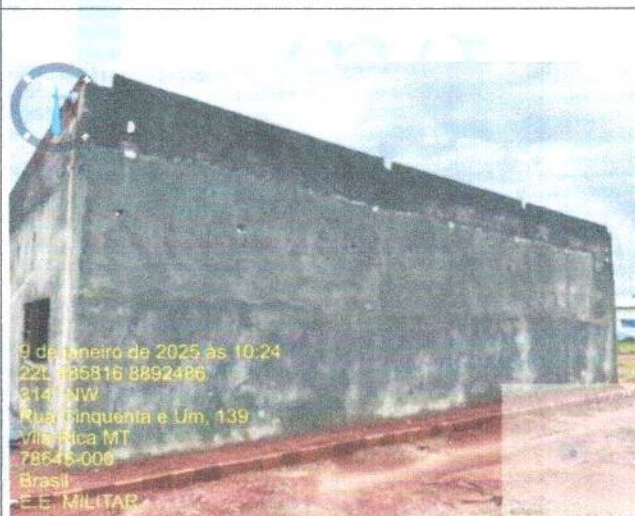

9 de janeiro de 2025 às 10:24
22L 486816 8892486
314° NW
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão (Fundos)
Data: 09/01/2025



GOVERNO MUNICIPAL DE
VILA RICA
PORTAL NORTE DE MATO GROSSO



9 de janeiro de 2025 às 10:21
22L 485807 8892482
174° S
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Vestiários (Parte Externa)
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 10:21
22L 485807 8892462
274° W
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Vestiários (Parte Externa)
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 10:29
22L 485782 8892480
100° E
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA


Conteúdo: Vestiários (Parte Externa)
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 10:18
22L 485788 8892479
165° S
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Vestiário Feminino
Data: 09/01/2025

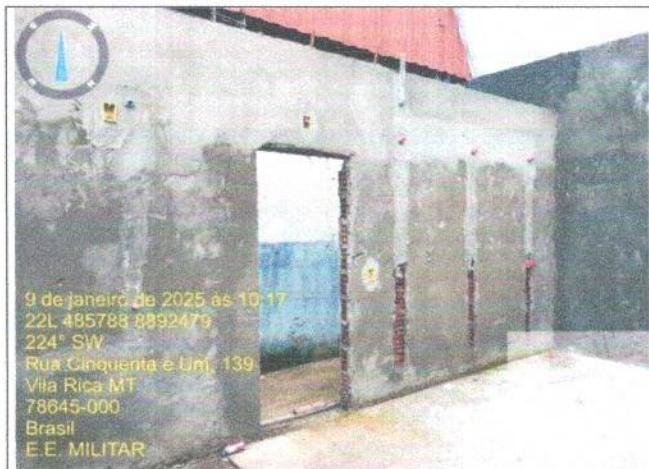

9 de janeiro de 2025 às 10:17
22L 485788 8892479
224° SW
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Vestiário Feminino
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 10:18
22L 485788 8892479
32° NE
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Entrada pela Quadra aos Vestiários
Data: 09/01/2025



9 de janeiro de 2025 às 10:31
22L 485815 8892480
325° NW
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão (Fachada)
Data: 09/01/2025




9 de janeiro de 2025 às 10:28
22L 485815 8892480
309° NW
Rua Cinquenta e Um, 139
Vila Rica MT
78645-000
Brasil
E.E. MILITAR

DESCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA

Conteúdo: Ampliação do Barracão (Vista Lateral/Vestiários)
Data: 09/01/2025

Vila Rica - MT, 30 de maio de 2025.

Resp. técnico: _____


Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
Eng. Civil CREA - MT 121118777-2
